

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



**RELATÓRIO PLANO DE OBRAS**  
**MAIO/2021**

## SUMÁRIO

<b>1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO</b> .....	4
<b>1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 3 OBRAS</b> .....	4
<b>1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 4 OBRAS</b> .....	6
<b>1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL</b> .....	7
<b>1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 22 PROJETOS</b> .....	8
<b>1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 8 PROJETOS</b> .....	14
<b>1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: 1 PROJETO</b> .....	16
<b>1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS</b> .....	16
<b>1.8 RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR</b> .....	18
<b>2. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b> .....	19
<b>3. DESEMBOLSOS</b> .....	20
<b>4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 20 AÇÕES</b> .....	21
<b>5. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS</b> .....	23
<b>5.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES</b> .....	24
<b>5.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO</b> .....	24
<b>5.3 MANUTENÇÃO GERADORES</b> .....	24
<b>5.4 MANUTENÇÃO PREDIAL</b> .....	25
<b>5.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER</b> .....	25
<b>5.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA</b> .....	26
<b>5.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b> .....	31
<b>5.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EVENTUAIS EM REGIME DE DISPENSA</b> .....	32
<b>6. ANEXO</b> .....	33
<b>6.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	33
<b>6.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	34
<b>6.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	36
<b>6.4 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	36
<b>6.5 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS</b> .....	38

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada pelo DEA/DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresento os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 15/06/2021.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
  - a. Todo dado indicado de % *executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF.
  - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo, contudo, a Divisão de Engenharia foi consultada quanto à similaridade, caso a caso, para o desempenho físico das obras em execução.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
  - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
  - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

## 1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

### 1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 3 OBRAS

<b>1</b>	<b>LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL</b>	<b>Construção Bloco Criminal</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 52.140.973,46</b>	
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão (contrato)	outubro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	20	
	Prazo decorrido de execução (meses)	14	
	% físico realizado	16,28%	
	Medição realizada	2ª RESIDUAL / 20	
	Medição requerida	3ª	
	% financeiro realizado consolidado	16,28%	
	Saldo a pagar	R\$ 43.650.638,69	
	% financeiro não consolidado (se houver)	21,09%	
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		
	Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%		

<b>2</b>	<b>AMPÉRE - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 6.133.337,92</b>	
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão (contrato)	dezembro, 2020	
	Nova data prevista conclusão	maio, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	14	
	Prazo decorrido de execução (meses)	19	
	% físico realizado	40,16%	
	Medição realizada	9ª / 14	
	Medição requerida	-	
	% financeiro realizado consolidado	45,09%	
	Saldo a pagar	R\$ 3.367.700,04	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	

<b>3</b>	<b>FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 35.555.555,55</b>	
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	abril, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	18	
	Prazo decorrido de execução (meses)	7	
	% físico realizado	2,01%	
	Medição realizada	3ª / 18	
	Medição requerida	4º	
	% financeiro realizado consolidado	3,89%	
	Saldo a pagar	R\$ 34.171.666,25	
	% financeiro não consolidado (se houver)	5,44%	
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

**1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 4 OBRAS**

Houve recebimento definitivo de uma obra, Novo Fórum da Comarca de Palmas, conforme planilhas abaixo.

<b>1</b>	<b>BELA VISTA DO PARAÍSO</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 8.156.223,56</b>
	Contratado	CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA
	Emissão OES	maio, 2018
	Data prevista conclusão	setembro, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	27 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Março, 2020
		Definitivo programado A agendar vistoria
	Inauguração/Ocupação	janeiro, 2021
	Conclusão	

<b>2</b>	<b>PALOTINA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 6.021.589,68</b>
	Contratado	XERRI E NOAL LTDA - EPP
	Emissão OES	abril, 2018
	Data prevista conclusão	junho, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	14
	Prazo decorrido de execução (meses)	15 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Julho, 2019
		Definitivo programado A agendar vistoria
	Inauguração/Ocupação	julho, 2019
	Conclusão	

	<b>PALMAS - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 6.276.382,03</b>
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA
	Emissão OES	junho, 2017
	Data prevista conclusão	novembro, 2018
	Prazo previsto execução (meses)	17
	Prazo decorrido de execução (meses)	17 NA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	99,79%
	Termo de Recebimento	<b>Definitivo</b> DEFIN. Maio, 2021
	Inauguração/Ocupação	novembro, 2018
	Conclusão	Maio, 2021

3	<b>MATELÂNDIA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 5.994.541,73</b>	
	Contratado	XERRI E NOAL LTDA - EPP	
	Emissão OES	maio, 2018	
	Data prevista conclusão	julho, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	14	
	Prazo decorrido de execução (meses)	16	FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%	
	% financeiro realizado consolidado	100,00%	
	Termo de Recebimento	Provisório	PROV. Setembro, 2019
		Definitivo programado	A agendar vistoria
	Inauguração/Ocupação	setembro, 2019	
	Conclusão		

4	<b>CURITIBA - PRÉDIO ANEXO</b>	<b>Sonorização Plenário</b>	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 4.953.726,74</b>	
	Contratado	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	maio, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	20	FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%	
	% financeiro realizado consolidado	96,73%	
	Termo de Recebimento	Provisório	PROV. Outubro, 2021
		Definitivo programado	A agendar vistoria
	Inauguração/Ocupação		
	Conclusão		

### 1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL

Não há obras em licitação ou preparação de edital de licitação.

#### 1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 22 PROJETOS

Houve a suspensão do contrato para desenvolvimento dos projetos para modernização do sistema de ar condicionado do Prédio Anexo ao Palácio da Justiça, e rescisão do contrato para os projetos da Usina Fotovoltaica de Campo Mourão, encontrando-se este último em procedimento de nova contratação.

<b>1</b>	<b>CORBÉLIA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 34.410,00</b>	
	Contratado	M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	4	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	11/06/2021	
	% físico realizado	Fases previstas	10
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	44,87%	
	Saldo a pagar	R\$ 18.970,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

<b>2</b>	<b>URAI - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 34.410,00</b>	
	Contratado	M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	8	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	24/10/2021	
	% físico realizado	Fases previstas	10
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	14,53%	
	Saldo a pagar	R\$ 29.410,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

<b>3</b>	<b>JOAQUIM TÁVORA - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 34.410,00</b>	
	Contratado	M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	09/09/2021	
	% físico realizado	Fases previstas	10
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	13,08%	
	Saldo a pagar	R\$ 29.910,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)		



<b>4</b>	<b>CARLÓPOLIS - PADRÃO 1500</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 51.170,00</b>	
	Contratado	M. BINDER ENGENHARIA LTDA. ME	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	5	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	26/07/2021	
	% físico realizado	Fases previstas	10
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	2,15%	
	Saldo a pagar	R\$ 50.070,00	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

<b>5</b>	<b>MARINGÁ - PROJETOS</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 899.994,58</b>	
	Contratado	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	31	
	Prazo decorrido de execução (meses)	32	
	Previsão de conclusão	30/05/2021	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	60,28%	
	Saldo a pagar	R\$ 357.477,14	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	MARINGÁ - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 182.977,86	65,46%

<b>6</b>	<b>CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS</b>	<b>Construção CJC</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 4.981.060,31</b>	
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	47	
	Prazo decorrido de execução (meses)	36	
	Previsão de conclusão		
	% físico realizado	Fases previstas	6
		Fases recebidas	1
	% financeiro realizado consolidado	24,55%	
	Saldo a pagar	R\$ 3.758.374,13	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		
	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
	<b>CONTRATO SUSPENSO ATÉ OUT/2021</b>	R\$ 901.144,22	0,00%

<b>7</b>	<b>COLOMBO - PROJETOS</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 457.187,55</b>	
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDEMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	24	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	
	Previsão de conclusão	21/12/2021	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	1
	% financeiro realizado consolidado	8,42%	
	Saldo a pagar	R\$ 418.685,87	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 114.800,00	0,00%

<b>8</b>	<b>PONTA GROSSA - PROJETOS</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 784.739,75</b>	
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	13	
	Prazo decorrido de execução (meses)	8	
	Previsão de conclusão		
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	1 parcial
	% financeiro realizado consolidado	20,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 627.791,80	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 164.800,00	7,00%

<b>CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA</b>		
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 447.447,00</b>	
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
Emissão OES	julho, 2020	
% físico realizado	Fases previstas	13
	Fases recebidas	1
% financeiro realizado consolidado	0,00%	
Saldo a pagar	R\$ 447.447,00	
% financeiro não consolidado (se houver)		
<b>9</b>	<b>CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	12	
Prazo decorrido de execução (meses)	11	
Previsão de conclusão	jul/21	
<b>10</b>	<b>PARANAÍ - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	14	
Prazo decorrido de execução (meses)	11	
Previsão de conclusão	set/21	
<b>11</b>	<b>UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
Emissão OES	julho, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	19	
Prazo decorrido de execução (meses)	11	
Previsão de conclusão	mar/22	

<b>CURITIBA - PRÉDIO ANEXO</b>		<b>Modernização Arcondicionado central</b>
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 259.000,00</b>	
Contratado	ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA – ME	
Emissão OES	janeiro, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	6	
Prazo decorrido de execução (meses)	17	
Previsão de conclusão		
% físico realizado	Fases previstas	5
	Fases recebidas	1 parcial
% financeiro realizado consolidado	15,00%	
Saldo a pagar	R\$ 220.150,00	
% financeiro não consolidado (se houver)		
<b>CONTRATO SUSPENSO ATÉ OUT/2021</b>		

<b>12 CURITIBA - SEDE MAUÁ</b>		<b>Modernização Arcondicionado central</b>
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 349.000,00</b>	
Contratado	ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL LTDA – ME	
Emissão OES	janeiro, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	6	

Prazo decorrido de execução (meses)	17	
Previsão de conclusão		
% físico realizado	Fases previstas	5
	Fases recebidas	1
% financeiro realizado consolidado	15,00%	
Saldo a pagar	R\$ 296.650,00	
% financeiro não consolidado (se houver)		
EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		

	<b>NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800</b>	
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 421.853,11</b>	
Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME	
Emissão OES	fevereiro, 2021	
% físico realizado	Fases previstas	34
	Fases recebidas	1
% financeiro realizado consolidado	1,67%	
Saldo a pagar	R\$ 414.808,16	
% financeiro não consolidado (se houver)		
<b>13</b>	<b>NOVA AURORA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	5
	Prazo decorrido de execução (meses)	3
	Previsão de conclusão	jul/21
<b>14</b>	<b>JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	5
	Prazo decorrido de execução (meses)	3
	Previsão de conclusão	jul/21
<b>15</b>	<b>BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Novo Fórum</b>
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	6
	Prazo decorrido de execução (meses)	3
	Previsão de conclusão	ago/21
<b>16</b>	<b>PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	6
	Prazo decorrido de execução (meses)	3
	Previsão de conclusão	ago/21
<b>17</b>	<b>TERRA RICA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	8
	Prazo decorrido de execução (meses)	3
	Previsão de conclusão	out/21
<b>18</b>	<b>PEABIRÚ - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Emissão OES	fevereiro, 2021

	Prazo previsto execução (meses)	8	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	out/21	
<b>19</b>	<b>IPORÃ - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	10	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	dez/21	
<b>20</b>	<b>SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	10	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	dez/21	
<b>21</b>	<b>MANGUEIRINHA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	fev/22	
<b>22</b>	<b>WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>	
	Emissão OES	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	3	
	Previsão de conclusão	fev/22	

**1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 8 PROJETOS**

<b>1</b>	<b>JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	ago/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>2</b>	<b>PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	out/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>3</b>	<b>QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	set/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>4</b>	<b>LOANDA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	out/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>5</b>	<b>MARIALVA - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	nov/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>6</b>	<b>SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	set/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>7</b>	<b>COLORADO - PADRÃO 1800</b>	<b>Construção Fórum Novo</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.980,00</b>
	Início do procedimento de preparação da contratação	fevereiro,2021
	Prazo estimado homologação da contratação	abr/21
	Prazo estimado emissão OES	abr/21
	Prazo estimado conclusão dos projetos	ago/21
	Fase ou localização atual	
	RESCINDIDO CONTRATO ADAPTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO 1800	

<b>8</b>	<b>CAMPO MOURÃO</b>	<b>Usina Fotovoltáica</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>R\$ 29.889,00</b>
	Início do procedimento de preparação da licitação	setembro, 2020
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	julho, 2021
	Prazo estimado publicação do Edital	julho, 2021
	Prazo estimado homologação do Edital	julho, 2021
	Prazo estimado emissão OES	agosto, 2021
	Fase ou localização atual	Análise DEA-DE

## 1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: 1 PROJETO

<b>1</b>	<b>IRATI E SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PROJETO ARQUITETÔNICO FÓRUM PADRÃO 5000</b>	
	Estudo de Viabilidade aprovado em	janeiro, 2021
	Início do procedimento de projeto arquitetônico	fevereiro, 2021
	Prazo estimado emissão projeto arquitetônico	maio, 2021
	Fase atual	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA FINALIZADO maio/2021

## 1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS

Durante o período, foi assinado o Despacho de Eleição do terreno na Comarca de Pirai do Sul.

Para informações adicionais, ver Relatório Aquisição Terrenos

COMARCA		STATUS	OBSERVAÇÕES
1	CLEVELÂNDIA	EM ANÁLISE	TERRENO VISTORIADO, CONSIDERADO TECNICAMENTE APTO. AGUARDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA COMARCA.
2	ALTO PARANÁ	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 01/2020
3	MORRETES	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2014
4	PIRAÍ DO SUL	ELEITO	DESPACHO DE ELEIÇÃO ASSINADO, ENVIADO À COMARCA PARA FORMALIZAR DOAÇÃO JUNTAMENTE COM A PREFEITURA
5	CÂNDIDO DE ABREU	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, AGUARDA ANÁLISE DA ARQUITETURA
6	PARANAGUÁ	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 04/2018
7	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	EM ANÁLISE	REALIZADA VISTORIA NO BEM A PERMUTAR (FÓRUM CENTRAL) AGUARDA MANIFESTAÇÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE SJPINHAIS FORNECIDOS PROJETOS À PREFEITURA
8	CAPANEMA	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2020 TRATATIVAS PARA PERMUTA SENDO REALIZADAS EM GRAU DE SECRETÁRIA DO TJPR AGUARDA MANIFESTAÇÃO DA DOADORA QUANTO À PERMUTA ACEITA PELA SECRETÁRIA
9	SENGÉS	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 08/2020




10	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 12/2020
11	PITANGA	EM ANÁLISE	NA ENGENHARIA PARA VISTORIA DO TERRENO DESDE 03/2020
12	MEDIANEIRA	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 09/2020. ENCAMINHADO NOVO TERRENO PARA ANÁLISE.
13	PIRAQUARA	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E PELA ARQUITETURA, AGUARDA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA DIREÇÃO DO FÓRUM (MATRÍCULA E OFÍCIO DOADOR)

## 1.8 RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		09/06/2021
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		888
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		699
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio	103
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio	57
	Idade média das construções (anos)	25,2
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIBA)		319.752,51
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMOVEIS EM USO FORENSE (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		34.464,07
ÁREA TOTAL DE IMOVEIS EM OUTROS USOS NAO FORENSES OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.660,18
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não forense)		388.876,76
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso forense e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
<b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR</b>		<b>581.911,69</b>
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS EM USO NAS COMARCAS		635.720,59
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		129.082,99
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
<b>ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA</b>		<b>962.647,33</b>
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS	<b>D</b>	46
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS		14
<b>VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL</b>		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 797.008.724,08
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.145.720.848,41
<b>VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR</b>		<b>R\$ 1.942.729.572,48</b>
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, podendo ter pequena diferença com o valor Hermes, devido a diferença de data de atualização da depreciação		
<b>NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR</b>		
<b>1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR</b>		
	EM USO FORENSE	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS	160	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	47
IMÓVEIS 2	13	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	2	0
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR</b>	<b>A</b> 195	<b>C</b> 63
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não forense)		
<b>2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA</b>		
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA</b>	<b>B</b> 36	
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO:	2	
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO FORENSE E ADMINISTRATIVO (A+B)</b>		<b>231</b>
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO) (A+B+C)</b>		<b>294</b>
<b>TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS) (D)</b>		<b>46</b>
<b>TOTAL GERAL DE UNIDADES (A+B+C+D)</b>		<b>340</b>

## 2. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

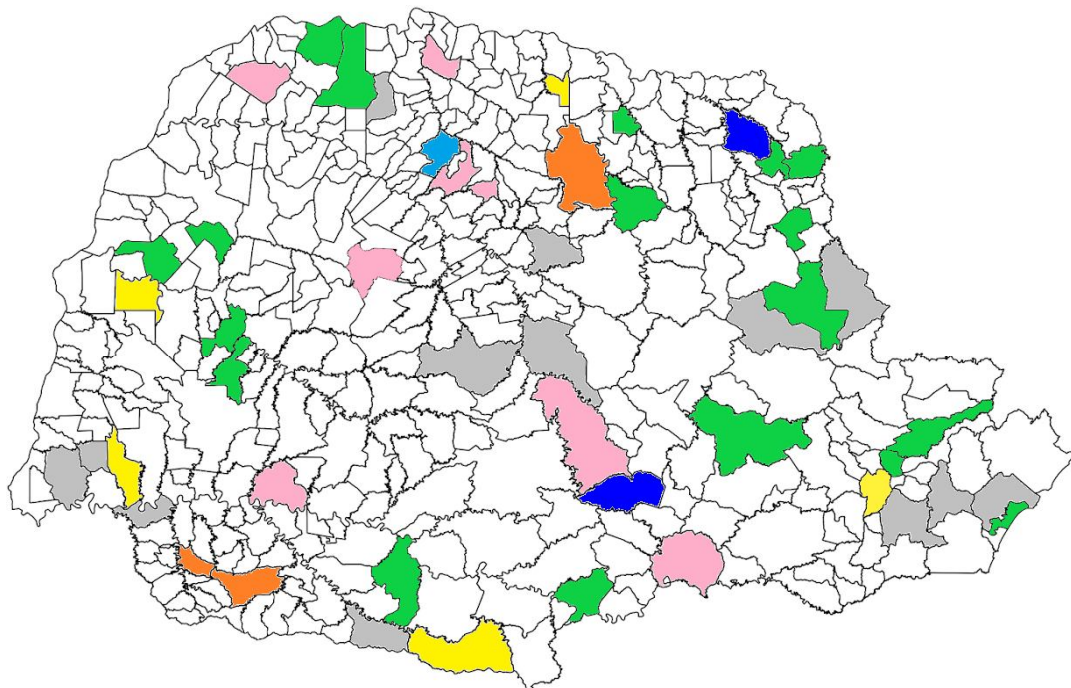

Obras em andamento
Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal
Ampére – Construção Novo Fórum
Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum

Obras em recebimento
Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum
Palotina – Construção Novo Fórum
Palmas – Construção Novo Fórum RECEBIDA
Matelândia – Construção Novo Fórum
Curitiba – Sonorização plenário Anexo

Obras em licitação ou preparação de edital

Projetos complementares contratados
Corbélia, Uráí, Joaquim Távora e Carlópolis - Projetos
Maringá – Projetos e Assessoramento
Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento
Colombo – Projetos e Assessoramento
Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento
Campo Mourão, Paranavá e União da Vitória – Projetos
Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos
Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos
Nova Aurora, Jaguariáiva, Bocaiúva do Sul, Pontal do Paraná, Terra Rica, Peabirú, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz – Projetos Novo Fórum

Projetos complementares em contratação/preparação
Jandaia do Sul, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Loanda, Marialva, São Mateus do Sul, Colorado – Projetos Novo Fórum
Campo Mourão – Usina Fotovoltaica - Projetos

Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade
Santo Antônio da Platina – Projeto Novo Fórum
Iratí – Projeto Novo Fórum


Terrenos em análise ou legalização de doação

### 3. DESEMBOLSOS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 2.827.185,95 correspondentes à 17,75% do valor inicialmente planejado de R\$ 17.948.688,27 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

Obras em execução:	R\$ 670.846,16
Obras em recebimento:	R\$ 0,00
Projetos complementares:	R\$ 533.797,62
Manutenção e Atas:	R\$ 1.622.542,17

O valores que não foram desembolsados no período de medição somam-se aos planejamento futuros, conforme ilustrado no gráfico de Desembolso Planejado, Realizado e a Realizar.

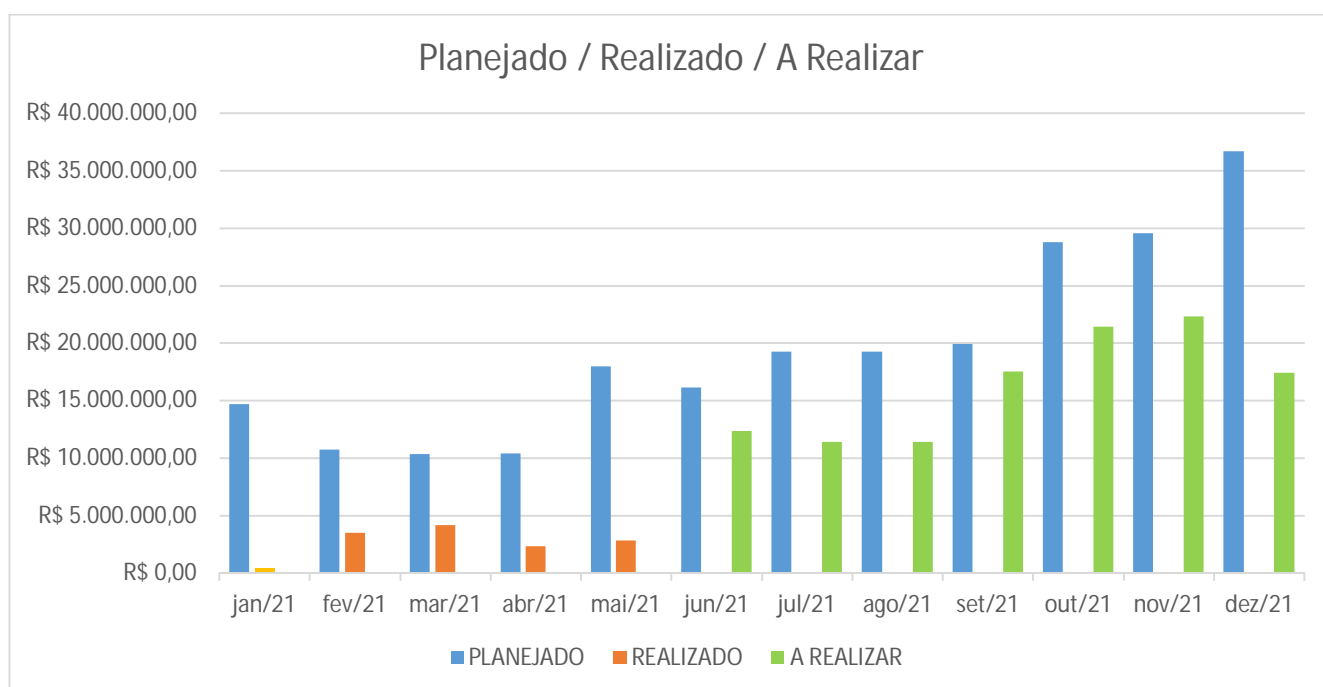

#### 4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 20 AÇÕES

No período do relatório foram finalizadas e recebidas obras de acessibilidade das Comarcas Marialva e São José dos Pinhais.

Para informações adicionais, ver Relatório Ações de Acessibilidade.

	COMARCA	STATUS	OES	Observações
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
2	Cambará	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6271373	13/07/2020	30/03/2021 Recebimento provisório
3	Capanema	PROJETO FINALIZADO		30/04/2021 Projeto de arquitetura finalizado, aguarda encaminhamento para contratação pela engenharia
4	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/11/2019	08/06/2021 Em preparação jurídica novo Aditivo de serviços e prazo
5	Curitiba - Tribunal do Juri	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	29/10/2020	29/10/2020 OS emitida 5741916
6	Curitiba - Tribunal Pleno 12º andar Anexo	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6341494	22/07/2020	09/04/2021 Recebimento provisório 6341494
7	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação
8	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação
9	Loanda	PREPARAÇÃO CONTRATAÇÃO POR LICITAÇÃO		29/03/2021 Procedimento enviado a DE para contratação via procedimento licitatório
10	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
11	Marialva	COM RECEBIMENTO DEFINITIVO 6413778 NO EXPEDIENTE 0071938-52.2018.8.16.6000		24/05/2021 Recebimento Definitivo 6413778
12	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação

13	Nova Londrina	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Projeto com DE para contratação
14	Pitanga	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	23/03/2020	31/05/2021 Termo aditivo formalizado prazo até 15/06/2021
15	Quedas do Iguaçu	EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
16	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação
17	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209
18	São José dos Pinhais	<b>COM RECEBIMENTO DEFINITIVO 6270924</b>	16/07/2020	13/04/2021 Recebimento Definitivo 6270924
19	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019
20	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação


## 5. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

### CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

1. Manutenção Elevadores
2. Manutenção Ar condicionado
3. Manutenção Geradores
4. Manutenção Predial
5. Manutenção Sala Segura e Data Center
6. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
7. Ata de Instalação de Ar condicionado
8. Demais contratações eventuais em regime de dispensa
9. A contratar: Instalação de Lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de R\$ 1.622.542,17 e acumulado anual de R\$ 7.996.431,81, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

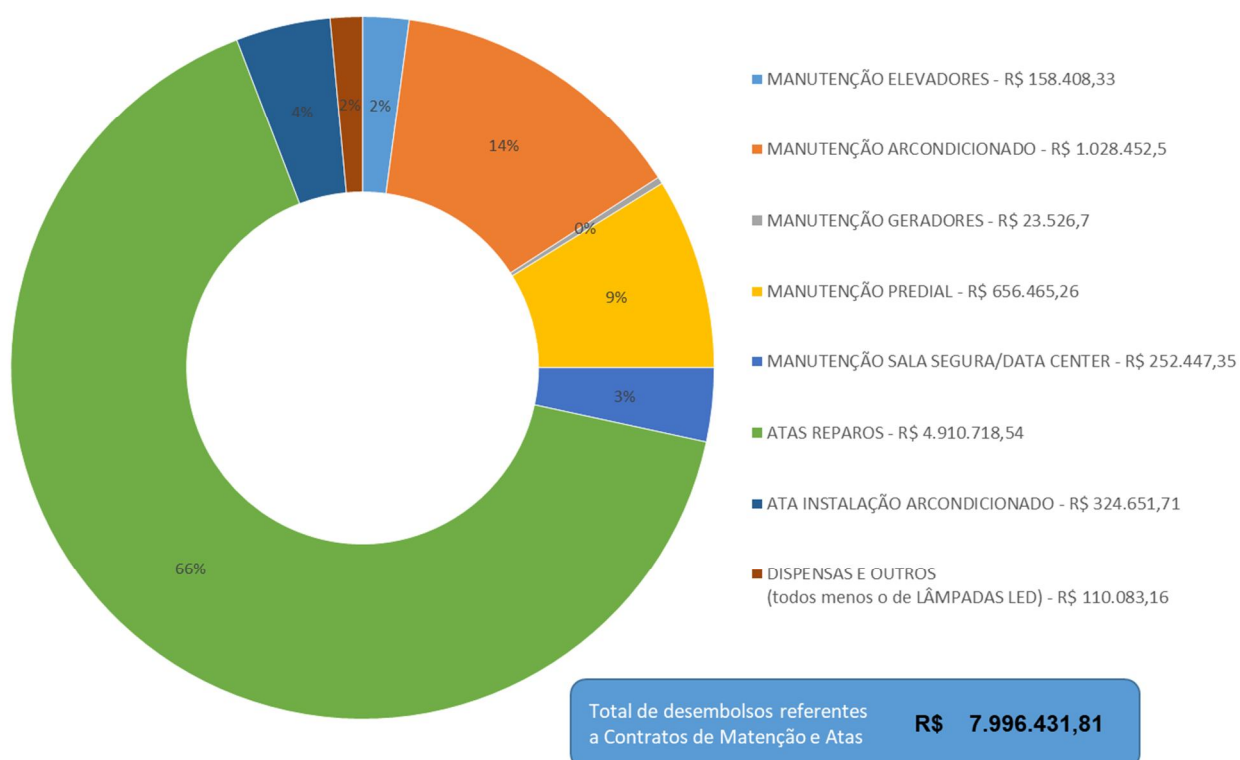

## DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:

### 5.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2021	R\$ 442.458,35
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2021	R\$ 117.597,36
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	03/05/2022	R\$ 142.897,88

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Regional Leste			
Regional Leste			
Regional Norte			

### 5.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	14/12/2021	R\$ 10.234.200,90

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Destino	Total de chamados	Finalizados	Abertos
Paraná total			
Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e finalizados no mês do relatório)			

### 5.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	18/08/2021	R\$ 294.166,48

Para unidades atendidas – ver ANEXO I



Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total			

#### 5.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva predial de edificações e ambientes de edificações do tribunal de justiça do estado do paraná com eventual fornecimento de peças e materiais

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Curitiba e RMC	PARALELO ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA	21/11/2021	R\$ 7.577191,25

Contrato em finalização

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	01/04/2022	R\$ 12.097.078,36

Contrato em atividade

#### TOTAL DE CHAMADOS MÊS 2021 – MANUTENÇÃO CORRETIVA

MODALIDADE	RECEBIDOS	FINALIZADOS	EM ABERTO
ALVENARIA			
CARPINTARIA			
CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES			
ELÉTRICA			
HIDRÁULICA			
JARDINAGEM			
PINTURA			
SERRALHERIA			
OUTROS			
TOTAIS			

#### PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – REALIZADA E PLANEJADA

LOCAL	MÊS

#### OBSERVAÇÕES:

1. Chamados finalizados no mês incluem os recebidos no mês anterior e finalizados no mês corrente.
2. Chamados em aberto no mês corrente serão finalizados no mês posterior.

#### 5.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	28/07/2021	R\$ 444.998,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2021	R\$ 547.800,00

### 5.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, e Londrina.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Regional Guarapuava	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	19/08/2021	R\$ 1.500.000,00
Regional RMC e Litoral	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	11/09/2021	R\$ 1.500.000,00
Regional Cascavel	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21/09/2021	R\$ 1.500.000,00
Regional Francisco Beltrão	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	24/06/2021	R\$ 1.000.000,00
Regional Londrina	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	05/10/2021	R\$ 1.500.000,00

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

### CONTRATOS DE REPAROS EM EXECUÇÃO E OBRAS DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

COMARCA - ESCOPO	RECEBIMENTO	VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
APUCARANA - CFTV	30-06-2020 - R ÚNICO	R\$ 135.815,26
ANTONINA	23/02/2021 - R PROVISORIO	R\$ 286.248,91
ANTONINA	05/05/2021 - R DEFINITIVO	R\$ 286.248,91
ALTO PARANA - MARITACAS	26-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 146.317,84

CURITIBA PERI MOREIRA - ENTRADA ENERGIA	11-01-2021 - R ÚNICO	R\$ 19.850,00
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ARCON	28-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 7.229,81
NOVA ESPERANÇA	15-04-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 450.992,93
TOLEDO - ARCON	18-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 2.036,09
IVAIPORA - ELETRICA	19-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 11.589,80
STA HELENA - ARCON	21-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 13.029,98
IBAITI - CFTV	22-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 72.066,16
MARMELEIRO - CONSTRUÇÃO	25-01-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 6.419.353,54
PONTAL DO PARANÁ - REPAROS	14/04/2021 - R DEFINITIVO	R\$ 8.124,66
PONTAL DO PARANÁ - REPAROS	14-04-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 8.124,66
ARAPONGAS - ARCON	18-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 10.592,81
CORNELIO PROCOPIO- SERVIÇOS DE ENGENHARIA	05-04-2021 - R ÚNICO	R\$ 57.268,76
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ILUMINAÇÃO E CFTV	30-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 122.219,70
CTBA ANEXO - REPAROS	09-04-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 129.733,82
CTBA ALVARO RAMOS - ARCON	04-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 7.740,81
FORMOSA DO OESTE - AR CONDICIONADO	10-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 57.586,67
CTBA PALÁCIO - LAUDO AVALIAÇÃO PREV INC	23-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 12.000,00
IMBITUVA - REFORMA	11-02-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 255.268,70
WENCESLAU BRÁS -	22-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 61.648,19
SANTA HELENA - REFORMA	26-01-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 298.113,53
MANGUEIRINHA - REPAROS	25-02-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 79.279,20
CTBA STA FELICIDADE - PROJETO ELÉTRICO	31-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 12.385,00
CAMBARA - REPAROS	30-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 176.860,63
SANTO ANTONIO DA PLATINA - ARCON	14-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 3.558,07
RIBEIRÃO DO PINHAL - REPAROS	25-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 258.823,65
PARANACITY - ARCON	18-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 4.481,74

MARILANDIA DO SUL - REPAROS	10-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 124.120,56
CAPANEMA - REPAROS	28-04-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 71.317,40
CANDIDO DE ABREU - ARCON	05-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 3.558,07
MANGUEIRINHA - SONORIZAÇÃO	30-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 9.136,68
ALTO PIQUIRI - ARCON	28/05/2021 - R ÚNICO	R\$ 51.613,16
BARRAÇÃO - REPAROS CFTV	31-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 139.290,57
PALMEIRA - REFORMA	17-02-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 299.398,30
PALMEIRA - REFORMA	30-04-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 299.398,30
GUARANIAÇU - REPAROS	20-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 10.633,81
GUARANIAÇU - REPAROS	24-05-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 10.633,81
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - CONSTRUÇÃO	20-05-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 76.309,74
CURITIBA JE PINHEIRINHO - REPAROS	22-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 33.046,70
CURITIBA JE PINHEIRINHO - REPAROS	22-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 33.046,73
LARANJEIRAS DO SUL	03-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 90.590,79
COLORADO - REPAROS	16-02-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 284.798,79
COLORADO - REPAROS	23-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 284.798,79
TELEMACO BORBA - ELÉTRICA SOM E CFTV	09-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 55.638,12
CTBA - MAUA	01-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 52.501,97
ENG BELTRÃO - REPAROS	16-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 71.986,73
MANDAGUAÇU - REPAROS	11-02-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 246.452,02
MANDAGUAÇU - REPAROS	11-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 246.452,02
ICARAIMA	25/01/2021 - R DEFINITIVO	R\$ 23.493,10
ALTO PIQUIRI - REPAROS	28-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 404.791,74
MEDIANEIRA - ARCON	10-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 16.613,81
CTBA - MAUA	12-01-2021 - R ÚNICO	R\$ 459.371,13
REGIONAL NORTE - MENUT ELEVADORES	08/04/2021 - R DEFINITIVO	R\$ 223.000,00

REGIONAL OESTE - MANUT ELEVADORES	08/04/2021 - R DEFINITIVO	R\$ 223.000,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - MANUTENÇÃO CFTV	21-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 23.724,64
ASSIS CHATEAUBRIANDT - REFORMA	26-01-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 114.856,04
COLORADO II - CFTV	16-02-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 94.892,49
COLORADO II - CFTV	23-03-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 94.892,49
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - REFORMAS	13-04-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 133.647,93
CTBA PALACIO - MANUT ELEVADORES	13-05-2021 - R DEFINITIVO	
PRIMEIRO DE MAIO	12-01-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 135.687,80
PRIMEIRO DE MAIO	15-04-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 135.687,80
PALMITAL	03-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 62.315,60
JANDAIA DO SUL - REPAROS	17-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 354.754,18
MARIALVA II - REPAROS	14-04-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 432.421,55
PARANAVAI	21-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 50.938,50
IBIPORA - ARCON	07/05/2021 - R ÚNICO	R\$ 21.964,62
ORTIGUEIRA - CFTV	22-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 45.962,67
CTBA CEJUSC	10-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 33.000,00
CASTRO - REFORMA	29-04-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 177.931,50
JAGUAPITA - ARCON	17/05/2021 - R ÚNICO	R\$ 5.185,24
MANDAGUARI - ARCON	06-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 4.481,74
IMBITUVA - ARCON	14-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 3.558,07
PARANAGUÁ - ADAPTAÇÃO LAYOUT	24-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 85.268,67
COLORADO - ARCON	21-05-2021 - R ÚNICO	R\$ 3.363,00
SIQUEIRA CAMPOS - REPAROS	17-02-2021 - R ÚNICO	R\$ 6.057,34
LONDRINA - REPAROS COBERTURA	19-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 584.926,88
MATELÂNDIA - ARCON	21/05/2021 - R ÚNICO	R\$ 14.075,70
GRANDES RIOS - ARCON	26/05/2021 - R ÚNICO	R\$ 11.711,55

SÃO JOSE DOS PINHAIS	22-01-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 44.629,49
CTBA - F CÍVEL MONTEPAR	25-05-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 14.900,00
CORONEL VIVIDA - SONORIZAÇÃO E MOTOR	04-03-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 26.141,56
SANTA IZABEL DO IVAÍ - REPAROS	14-05-2021 - R DEFINITIVO	R\$ 102.647,46
IBAITI - ADEQUAÇÕES	15-01-2021 - R ÚNICO	R\$ 35.540,62
CTBA - ANEXO - CARPET PLENÁRIO	14-05-2021 - R PROVISÓRIO	R\$ 64.304,80

ESCOPO	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO
GUARATUBA II	29/06/2020	27/10/2020	VENCIDO - FALTA PAGAR 50%
CTBA PALÁCIO - MANUTENÇÃO ELEVADORES	11/08/2020	09/11/2020	JONAS DECLAROU QUE ACABOU MAS N COLOCOU TRD
AMPERE - CONSTRUÇÃO	15/10/2019	15/12/2020	VENCIDO - FALTA PAGAR 53,91%
CURITIBA - DEA	28/10/2020	26/01/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 66,10%
IBAITI - ADEQUAÇÕES	30/11/2020	14/01/2021	VENCIDO - FALTA 100%
SÃO JOÃO DO IVAÍ - REPAROS	13/10/2020	10/02/2021	FALTA PAGAR 50%
CRUZEIRO DO OESTE - REPAROS	13/10/2020	10/02/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 76,37%
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - CFTV	30/11/2020	15/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 30%
XAMBRE - CFTV	01/02/2021	02/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 100%
CTBA - STA FELICIDADE - REFORMA	18/11/2019	14/03/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 10,33%
PARANACITY - REPAROS	05/11/2020	05/03/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 64,18%
CTBA - VARAS DE FAMÍLIA CFTV	28/10/2020	07/05/2021	FALTA 100%
PATO BRANCO - REPAROS	04/11/2020	04/03/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 24,72%
SANTA IZABEL DO IVAÍ - REPAROS	04/11/2020	04/03/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 29,64%
GUARAPUAVA	07/10/2020	21/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 25,21%
CTBA DEA - ESGOTO	22/02/2021	23/04/2021	FALTA 100%
FORMOSA DO OESTE - AR CONDICIONADO	01/02/2021	22/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 50%
SALTO DO LONTRA - REPAROS	01/10/2020	26/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 34,66%
TOLEDO - REPAROS	15/03/2021	29/04/2021	VENCIDO - FALTA 100%
BARRAÇÃO - REPAROS CFTV	01/12/2020	16/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 50%
RIBEIRÃO DO PINHAL - CFTV	18/01/2021	18/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 100%
CTBA - VEP	28/10/2020	28/04/2021	VENCIDO -
ENG BELTRÃO - REPAROS	05/10/2020	25/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 100%
CONGONHINHAS - REPAROS	11/01/2021	11/04/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 72,49%
TOLEDO - ARCON	26/04/2021	26/05/2021	FALTA 100%
STA HELENA - ARCON	05/04/2021	05/05/2021	FALTA 100%
ARAPONGAS - ARCON	26/04/2021	26/05/2021	FALTA 100%
CTBA - EDIFÍCIO PERI MOREIRA	28/07/2020	01/05/2021	FALTA PAGAR 32,59%

CURITIBA - TRIBUNAL DO JÚRI - REPAROS	04/11/2020	03/05/2021	FALTA PAGAR 31,36%
RIBEIRÃO DO PINHAL - REPAROS	22/02/2021	23/05/2021	FALTA 100%
PARANACITY - ARCON	26/04/2021	26/05/2021	FALTA 100%
CANDIDO DE ABREU - ARCON	26/04/2021	26/05/2021	FALTA 100%
CTBA MAUA - REPAROS	12/03/2021	26/05/2021	FALTA 100%
IBIPORA - ARCON	26/04/2021	26/05/2021	FALTA 100%
IMBITUVA - ARCON	26/04/2021	26/05/2021	FALTA 100%
CTBA MAUA - REPAROS	25/03/2020	05/05/2021	VENCIDO - FALTA PAGAR 50%
MATELÂNDIA - ARCON	05/04/2021	05/05/2021	FALTA 100%
PITANGA - ADEQUAÇÃO INCENDIO	23/03/2020	09/05/2021	FALTA PAGAR 41,25%
PARAÍSO DO NORTE - REPAROS	11/01/2021	11/05/2021	FALTA PAGAR 75%
ROLANDIA - REPAROS NA COBERTURA	15/02/2021	16/05/2021	FALTA 100%
SANTA MARIANA - CFTV	18/02/2021	19/05/2021	FALTA 100%
CTBA - PALÁCIO - CARPET PLENÁRIO	02/02/2021	26/05/2021	FALTA PAGAR 22,33%
SENGES - ARCON	03/05/2021	02/06/2021	FALTA 100%
RIBEIRÃO CLARO - SONORIZAÇÃO	24/03/2021	22/06/2021	FALTA 100%
JAGUAPITA - ARCON	03/05/2021	02/06/2021	FALTA 100%
MANDAGUARI - ARCON	03/05/2021	02/06/2021	FALTA 100%
COLORADO - ARCON	03/05/2021	02/06/2021	FALTA 100%
LARANJEIRAS DO SUL - REPAROS	08/02/2021	08/07/2021	FALTA PAGAR 50%
ANDIRÁ - REPAROS	12/04/2021	11/07/2021	FALTA 100%
FOZ - REPAROS	29/03/2021	27/07/2021	FALTA 100%
XAMBRE - REPAROS	08/03/2021	06/07/2021	FALTA 100%
CTBA CENTRO JUDICIÁRIO - REPAROS	22/03/2021	29/08/2021	FALTA 100%
MAIS DE UMA - MANUTENÇÃO GERADORES	18/08/2018	18/08/2021	FALTA PAGAR 47,39%
UMUARAMA - REFORMA	15/04/2021	13/08/2021	FALTA 100%
LONDRINA - AR CONDICIONADO	17/06/2019	19/09/2021	FALTA SEGUNDO ADITIVO E TERMO DE RECEBIMENTO
LONDRINA - CONSTRUÇÃO	11/03/2020	11/11/2021	FALTA PAGAR 10,11%
FRANCISCO BELTRÃO - CONSTRUÇÃO	13/10/2020	06/04/2022	FALTA PAGAR 96,11%
SANTA FÉ - REPAROS	07/10/2019		SUSPENSA
CAMPO MOURÃO - USINA FOTOVOLTAICA	14/11/2019		RESCISÃO E CONTRATAÇÃO SEGUNDA

## 5.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA -EPP	11/08/2021	R\$ 1.500.000,00

Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total			

#### 5.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EVENTUAIS EM REGIME DE DISPENSA

Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	26/02/2025	R\$ 3.400.089,00

Pagamentos realizados no período

Destino/objeto	Medição	Valor pago
ESTADO – instalação lâmpadas LED	1ª parcela	R\$ 531.678,26



## 6. ANEXO

### 6.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS

#### REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Almirante tamandaré
Campina grande do sul
Campo largo
Curitiba - alvaro ramos
Curitiba - anexo
Curitiba - ahú
Curitiba - boqueirão
Curitiba - cic
Curitiba - fazenda pública
Curitiba - f. Cível
Curitiba - f. Cível ii
Curitiba - mateus leme
Curitiba - mauá
Curitiba - je pinheirinho
Curitiba – rua da glória, 290
Curitiba – rua da glória, 362
Curitiba – rua da glória, 393
Curitiba - santa felicidade
Curitiba – vep
Curitiba – técnico residente
Guarapuava
Guaratuba
Lapa
Paranaguá
Paranaguá – jecc
Piraquara
Ponta grossa
Rio negro
São José dos Pinhais, v. Infância e juventude
São José dos Pinhais, v. Fazenda pública
Teixeira soares
União da vitória
União da vitória – v de família

#### REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Assis chateaubriand
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Coronel vivida
Dois vizinhos
Foz do iguaçu
Francisco beltrão
Laranjeiras do sul
Marechal cândido rondon

Medianeira
Pato branco
Quedas do iguaçu
Santo antônio do sudoeste
São miguel do iguaçu
Toledo

## REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS

Apucarana
Bela vista do paraíso
Cambé
Campo mourão
Cianorte
Congoinhas
Cornélio procópio
Cruzeiro do oeste
Engenheiro beltrão
Ibaiti
Ibiporã
Ivaiporã
Londrina – fórum cível
Londrina - vep
Marialva
Maringá – fórum principal
Maringá – juizado especial
Maringa – fórum novo
Porecatu
Santa fé
Santo antônio da platina
Telêmaco borba
Terra boa
Tibagi

## 6.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS

### PARANÁ TOTAL

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947  
 LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

Split Hi Wall 7.500Btu/h	17
Split Hi Wall 9.000Btu/h	198
Split Hi Wall 12.000Btu/h	322
Split Hi Wall 18.000Btu/h	788
Split Hi Wall 22.000Btu/h	52
Split Hi Wall 24.000Btu/h	521
Split Hi Wall 30.000Btu/h	346
Split Piso-Teto 12.000Btu/h	21
Split Piso-Teto 18.000Btu/h	24

Split Piso-Teto 24.000Btu/h	58
Split Piso-Teto 30.000Btu/h	36
Split Piso-Teto 36.000Btu/h	201
Split Piso-Teto 42.000Btu/h	5
Split Piso-Teto 48.000Btu/h	123
Split Piso-Teto 60.000Btu/h	148
Split Cassete 18.000Btu/h	110
Split Cassete 24.000Btu/h	61
Split Cassete 30.000Btu/h	55
Split Cassete 36.000Btu/h	63
Split Cassete 48.000Btu/h	95
Split Cassete 60.000Btu/h	15
Split Built-in 30.000Btu/h	1
Split Built-in 48.000Btu/h	3
Split Built-in 60.000Btu/h	2
Janeleiro 2.500Btu/h	2
Janeleiro 7.500Btu/h	5
Janeleiro 10.000Btu/h	10
Janeleiro 12.000Btu/h	134
Janeleiro 15.000Btu/h	4
Janeleiro 18.000Btu/h	126
Janeleiro 19.000Btu/h	135
Janeleiro 20.000Btu/h	1
Janeleiro 21.000Btu/h	191
Janeleiro 30.000Btu/h	74
Cortina de Ar	36
Caixas de Ventilação Mecânicas	15

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos
Curitiba – anexo
Curitiba – centro judiciário
Curitiba – champagnat
Curitiba – mauá
Curitiba – palácio da justiça
Curitiba – pinheirinho
Curitiba – restaurante
Curitiba – tribunal do júri
Campo largo
Guaratuba
Guarapuava
Rio negro
Lapa
Laranjeiras do sul
Cascavel
Coronel vivida
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Pato branco
Toledo
Cambé

Engenheiro beltrão
Jacarezinho
Paraíso do norte
Santa fé
Terra boa
Marechal cândido rondon

### 6.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

#### PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

##### Curitiba:

Prédio Álvaro Ramos.
Palácio da Justiça.
Palácio da Justiça Anexo.
Sede Mauá.
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.
Fórum Cível II.

##### Outras Comarcas:

Foz do Iguaçu.
Londrina.
Guarapuava.

### 6.4 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS

#### CURITIBA E RMC

##### Curitiba

Sede álvaro ramos
Casa 1 álvaro ramos
Casa 2 álvaro ramos
Barracão anita garibaldi
Arquivo pinhais
Barracão flávio dallegrove
Sede lysimaco f. Da costa
Centro de educação infantil
Cetrans
Casas vila domitila (5)
Centro judiciário de curitiba
Sede cândido de abreu
Antiga lba
Sede rua da glória 1
Sede rua da glória 2
Sede rua da glória 3

Sede nilo peçanha
Departamento de engenharia e arquitetura
Escola da magistratura
Fórum cível i
Fórum cível ii
Sede mauá
Sede mauá 2
Fúrum descentralizado boqueirão
Fúrum descentralizado santa felicidade
Fúrum descentralizado cic
Fúrum descentralizado pinheirinho
Fúrum descentralizado sitio cercado
Sede mateus leme
Complexo do palácio da justiça
Tribunal do juri
Sede avenida iguaçu
Vara de adolescentes tarumã
Varas de execuções penais

## RMC

Almirante tamandaré	Fórum central
Antonina	Fórum central
Araucária	Fórum central
Bocaiúva do sul	Fórum central
Campina grande do sul	Fórum central
Campina grande do sul	Fórum antigo
Campo largo	Fórum central
Cerro azul	Fórum central
Colombo	Fórum central
Colombo	Jecc
Colombo	Arquivos
Colombo	Varas cíveis
Colombo	Vara família
Colombo	Arquivos
Fazenda rio grande	Fórum central
Guaratuba	Fórum central
Matinhos	Fórum central
Morretes	Fórum central
Paranaguá	Fórum central
Paranaguá	Fórum cível
Paranaguá	Jecc
Paranaguá	Arquivos varas cíveis
Pinhais	Fórum central
Piraquara	Fórum central
Piraquara	Vara família e vara cível
Pontal do paraná	Fórum central
Rio branco do sul	Fórum central
São josé dos pinhais	Fórum central
São josé dos pinhais	Vara criminal e vara inf e juv.

São José dos Pinhais	Jecc
São José dos Pinhais	Vara fazenda pública

## 6.5 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

### REGIONAL GUARAPUAVA

Cândido de abreu
Cantagalo
Guarapuava
Irati
Iretama
Ivaiporã
Laranjeiras do sul
Mallet
Manoel ribas
Palmital
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
União da vitória

### REGIONAL RMC E LITORAL

Araucária,
Almirante Tamandaré,
Antonina,
Bocaiúva do Sul,
Campina Grande do Sul,
Campo Largo,
Cerro Azul,
Colombo,
Fazenda Rio Grande,
Guaratuba,
Matinhos,
Morretes,
Paranaguá,
Pinhais,
Piraquara,
Pontal do Paraná,
Rio Branco do Sul,
São José dos Pinhais.

### REGIONAL DE CASCAVEL

Assis chateaubriand
Campina da lagoa
Capanema
Capitão leônidas marques
Cascavel
Catanduvas
Corbélia

Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Guaraniaçu
Mamborê
Marechal cândido rondon
Matelândia
Medianeira
Nova aurora
Palotina
Quedas do iguaçu
Santa helena
São miguel do iguaçu
Toledo
Ubiratã

#### **REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO**

Ampére
Barracão
Chopinzinho
Clevelandia
Coronel vivida
Dois vizinhos
Francisco beltrão
Mangueirinha
Marmeleiro
Palmas
Pato branco
Realeza
Salto do lontra
Santo antônio do sudoeste
São joão

#### **REGIONAL DE LONDRINA**

Apucarana,
Arapongas
Assaí
Bela Vista do Paraíso
Cambé
Congonhinhas
Faxinal
Grandes Rios
Ibiporã
Londrina
Marilândia do Sul
Ortigueira
Primeiro de Maio
Rolândia
São Jerônimo da Serra
Sertanópolis
Uraí.
