

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**



**RELATÓRIO PLANO DE OBRAS**  
**OUTUBRO/2023**

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DPCE e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 14/11/2023.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
  - a. Todo dado indicado de % *financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
  - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
  - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
  - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

## 1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

### 1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 7 OBRAS

1	LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	EM OBRA BLOCO CRIMINAL	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 63.955.098,48	ATRASADO
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	junho, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	39	
	Prazo decorrido de execução (meses)	43	
	% físico realizado	54,90%	
	Medição realizada	14ª / 20	
	Financeiro realizado	R\$ 35.114.193,77	
	Saldo a pagar	R\$ 28.840.904,71	
	Termo de Recebimento		

2	AMPÉRE - PADRÃO 1800	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.610.937,15	ATRASADO
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	junho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	31	
	Prazo decorrido de execução (meses)	48	
	% físico realizado	41,83%	
	Medição realizada	11ª / 14	
	Financeiro realizado	R\$ 2.765.637,88	
	Saldo a pagar	R\$ 3.845.299,27	
	Termo de Recebimento		

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 45.199.004,14	ATRASADO
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	abril, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	29	
	Prazo decorrido de execução (meses)	36	
	% físico realizado	80,09%	
	Medição realizada	15ª / 18	
	Financeiro realizado	R\$ 36.202.017,01	
	Saldo a pagar	R\$ 8.996.987,13	
	Termo de Recebimento		

4	CORBÉLIA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.394.656,50	ATRASADO
	Emissão OES	novembro, 2021	


Data prevista conclusão	janeiro, 2023
Prazo previsto execução (meses)	13
Prazo decorrido de execução (meses)	23
% físico realizado	17,35%
Medição realizada	4ª / 13
Financeiro realizado	R\$ 1.629.827,06
Saldo a pagar	R\$ 7.764.829,44
Termo de Recebimento	

<b>5</b>	<b>NOVA AURORA - PADRÃO 1500</b>	<b>EM OBRA NOVO FÓRUM</b>	<b>STATUS</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 10.382.432,41</b>	<b>ATRASADO</b>
	Emissão OES	agosto, 2022	
	Data prevista conclusão	agosto, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	15	
	% físico realizado	36,70%	
	Medição realizada	7ª / 12	
	Financeiro realizado	R\$ 3.810.222,83	
	Saldo a pagar	R\$ 6.572.209,58	
	Termo de Recebimento		

<b>6</b>	<b>TERRA RICA - PADRÃO 1500</b>	<b>EM OBRA NOVO FÓRUM</b>	<b>STATUS</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 11.198.000,00</b>	<b>ALERTA</b>
	Emissão OES	outubro, 2022	
	Data prevista conclusão	outubro, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	12	
	% físico realizado	41,81%	
	Medição realizada	6ª / 12	
	Financeiro realizado	R\$ 4.681.604,54	
	Saldo a pagar	R\$ 6.516.395,46	
	Termo de Recebimento		

<b>7</b>	<b>CAMPO MOURÃO</b>	<b>EM OBRA USINA FOTOVOLTAICA</b>	<b>STATUS</b>
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	<b>R\$ 30.779.582,30</b>	<b>ALERTA</b>
	Emissão OES	maio, 2023	
	Data prevista conclusão	fevereiro, 2024	
	Prazo previsto execução (meses)	9	
	Prazo decorrido de execução (meses)	5	
	% físico realizado	0,00%	
	Medição realizada	0 / 9	
	Financeiro realizado	R\$ 0,00	
	Saldo a pagar	R\$ 30.779.582,30	
	Termo de Recebimento		

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:

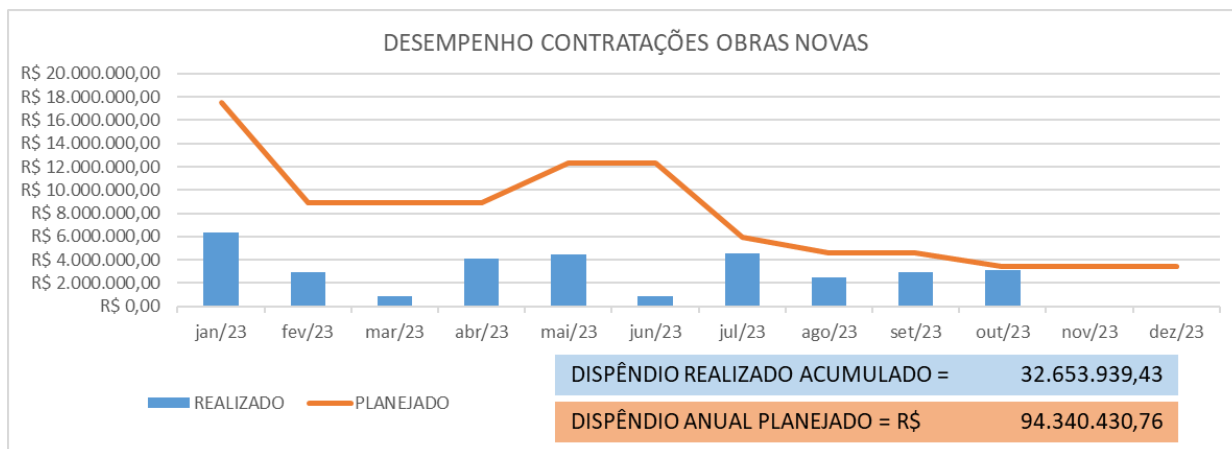

## 1.2 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 18 OBRAS

<b>1</b>	<b>COLORADO - PADRÃO 1500</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>2</b>	<b>JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1500</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>3</b>	<b>LOANDA - PADRÃO 1500</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>4</b>	<b>MARIALVA - PADRÃO 1500</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>5</b>	<b>PRUDENTÓPOLIS</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>6</b>	<b>QUEDAS DO IGUAÇU - PADRÃO 1500</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>7</b>	<b>SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1500</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>8</b>	<b>IPORÃ - PADRÃO 650 PLUS</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>9</b>	<b>PEABIRU - PADRÃO 650 PLUS</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>10</b>	<b>PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 650 PLUS</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>11</b>	<b>BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>12</b>	<b>CARLÓPOLIS - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>13</b>	<b>CENTENÁRIO DO SUL - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>14</b>	<b>JOAQUIM TÁVORA - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>15</b>	<b>MANGUEIRINHA - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>16</b>	<b>RIBEIRÃO DO PINHAL - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>17</b>	<b>SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

<b>18</b>	<b>URAI - PADRÃO 650</b>	<b>CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO</b>
	Valor máximo estimado licitação	<b>sigiloso</b>
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

1.3. PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 7 PROJETOS

<b>1</b>	<b>CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 4.981.060,31</b>	<b>ATRASADO</b>
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	56	
	Prazo decorrido de execução (meses)	65	
	% financeiro realizado consolidado	25,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 3.735.795,24	

<b>2</b>	<b>COLOMBO - PROJETOS</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 457.187,55</b>	<b>ATRASADO</b>
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	36	
	Prazo decorrido de execução (meses)	47	
	% financeiro realizado consolidado	58,79%	
	Saldo a pagar	R\$ 188.408,65	

<b>3</b>	<b>PONTA GROSSA - PROJETOS</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 784.739,75</b>	<b>ATRASADO</b>
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	26	
	Prazo decorrido de execução (meses)	37	
	% financeiro realizado consolidado	54,75%	
	Saldo a pagar	R\$ 355.132,89	

<b>4</b>	<b>3 FORUNS P10000 - CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 447.447,00</b>	<b>ATRASADO</b>
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
	Emissão OES (reinício de contrato)	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	40	
	% financeiro realizado consolidado	24,70%	
	Saldo a pagar	R\$ 336.927,59	

<b>5</b>	<b>10 FÓRUNS P1500 - NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCEWSLAU BRAZ</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>




Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 397.624,71</b>	<b>ATRASADO</b>
Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME	
Emissão OES (reinício de contrato)	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	12	
Prazo decorrido de execução (meses)	32	
% financeiro realizado consolidado	61,10%	
Saldo a pagar	R\$ 154.689,50	

<b>6</b>	<b>7 FÓRUNS - JANDAIA DO SUL, PRUDENTÓPOLIS, QUEDAS DO IGUAÇU, LOANDA, MARIALVA, SÃO MATEUS DO SUL, COLORADO</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 208.999,00</b>	<b>ATRASADO</b>	
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME		
Emissão OES (reinício de contrato)	julho, 2021		
Prazo previsto execução (meses)	12		
Prazo decorrido de execução (meses)	28		
% financeiro realizado consolidado	58,28%		
Saldo a pagar	R\$ 87.199,20		

<b>7</b>	<b>CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA FOTOVOLTAICA)</b>	<b>COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>STATUS</b>
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	<b>R\$ 23.485,00</b>	<b>ATRASADO</b>	
Contratado	ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Emissão OES (reinício de contrato)	fevereiro, 2023		
Prazo previsto execução (meses)	2		
Prazo decorrido de execução (meses)	8		
% financeiro realizado consolidado	0,00%		
Saldo a pagar	R\$ 23.485,00		<b>STATUS</b>

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:

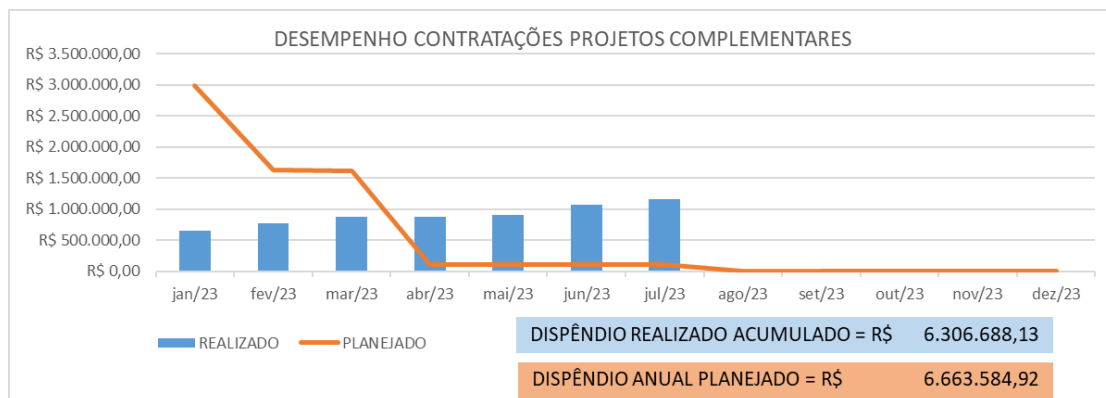

1.4. PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 0 PROJETOS

1.5. ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: X ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

No período, foram elaborados 10 estudos técnicos preliminares, para as Comarcas de Curitiba, Mamborê, Clevelândia, Iretama, Faxinal, Regional 05 (Região Metropolitana de Curitiba e Litoral) e Ponta Grossa.

1.6. TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS


Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de significativa de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso.

Nº	COMARCA	STATUS	Protocolo		Área e situação de Terreno
1	ALTO PARANÁ	TERRENO OFERTADO CONSIDERADO INADEQUADO AGUARDA POSICIONAMENTO DA COMARICA	0044842-67.2015	7159920	4.393,37 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
2	MORRETES	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0065613-61.2018	7649592	8.447,84 m <sup>2</sup> (terreno eleito)
3	PIRAÍ DO SUL	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0065866-15.2019	7158450	5.000,00 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
4	CÂNDIDO DE ABREU	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	0017074-64.2018	8188927	6.052,54 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
5	PARANAGUÁ	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0083854-54.2016	9160960	14.903,07 m <sup>2</sup> (terreno eleito)
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0055920-19.2019	9679887	6.910,83 m <sup>2</sup> (terreno propsto)
7	CAPANEMA	MUNICÍPIO DECIDIU DAR OUTRA DESTINAÇÃO AO TERRENO	0026468-61.2019	9738757	6.712,99 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
8	SENGÉS	EM ANÁLISE NOVO TERRENO	0095784-64.2019	9184841	4.240,4 m <sup>2</sup> (terreno doado) Novo terreno ofertado 4.820,68 m <sup>2</sup>
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	EM ANÁLISE TERRENOS	0061298-53.2019	9393208	5.000,00 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
10	PITANGA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	0086215-39.2019	8827848	10.000,00 m <sup>2</sup> (terreno doado) Pedida reversão da doação Novo terreno proposto, 10.000,00 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
11	MEDIANEIRA	EM ANÁLISE TERRENOS	0053483-05.2019	9345164	6.880,00 m <sup>2</sup> (terreno proposto)
12	PIRAQUARA	EM ANÁLISE TERRENOS	0080776-47.2019	9731087	5.732,87 m <sup>2</sup> (terreno proposto) 4.617,35 m <sup>2</sup> (Terreno do Fórum Atual)
13	JAGUAPITÃ	EM ANÁLISE TERRENOS	0075981-27.2021	9014038	Em análise de novas áreas


## 2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		09/11/2023
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		907
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		723
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio	103
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio	59
	Idade média das construções (anos)	27,0
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIBA)		323.296,67
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		34.602,51
ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.367,38
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º - como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)		392.266,56
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
<b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR</b>		<b>585.301,49</b>
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS		643.277,41
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		126.716,49
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
<b>ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA</b>		<b>967.837,65</b>
<b>NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS</b> <b>D</b>		<b>45</b> 316.221,49
<b>NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS</b>		<b>14</b> 88.141,20
<b>VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES</b>		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 760.826.100,17
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.093.585.423,59
<b>VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR</b>		<b>R\$ 1.854.411.523,76</b>
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes		
<b>NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR</b>		
<b>1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR</b>		
	<b>EM USO JUDICIÁRIO</b>	<b>SEM USO OU OUTROS USOS</b>
FÓRUNS CENTRAIS	162	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	46
IMÓVEIS 2	13	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	1	0
<b>INTERIOR TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO</b> <b>A</b>	<b>196</b>	<b>C</b> <b>62</b>
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)		
<b>2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA</b>		
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA</b> <b>B</b>	<b>36</b>	
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2	
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO</b> <b>(A+B)</b>		<b>232</b>
<b>TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)</b> <b>(A+B+C)</b>		<b>294</b>
<b>TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)</b> <b>(D)</b>		<b>45</b>
<b>TOTAL GERAL DE UNIDADES</b> <b>(A+B+C+D)</b>		<b>339</b>

### IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE



### IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO

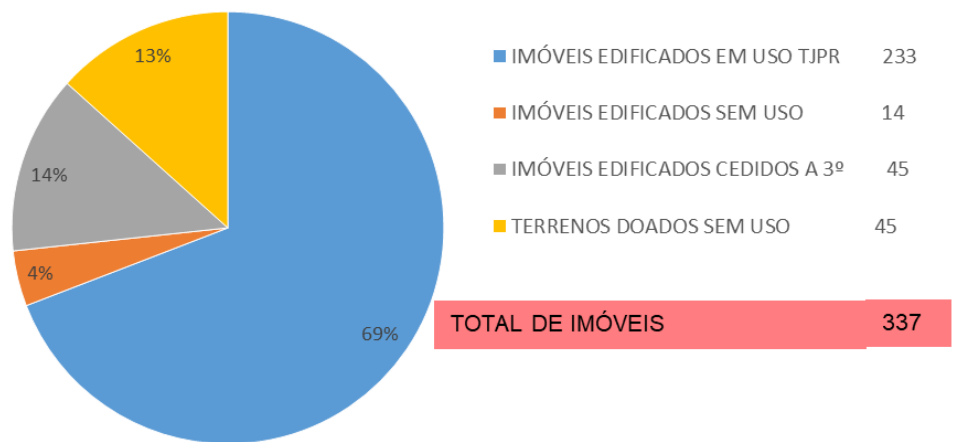



#### 4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 14 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo.




PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE					
COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE					
	COMARCA	STATUS	OES	Observações	MOV. SEI
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com a Comarca para instrução do expediente	8002804
2	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DE para levantamento e contratação	8168237
3	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DE para levantamento e contratação	7904856
4	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DE para levantamento e contratação	5149922
5	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DE para levantamento e contratação	9260457
6	Quedas do Iguaçu	CONTRATAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO		Com DO Encaminhado ao novo Eng. Fiscal	8086644
7	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DE para contratação	8878521
8	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Submetido à comarca para análise em 12/2019	9630959
9	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Análise da conveniência da contratação 12/08/2022,	8149144
10	Apucarana	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DO para levantamento e contratação	7785845
11	Rebouças	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		Com DO para levantamento e contratação	9378462


#### 5. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de **R\$ 7.085.155,65** correspondentes a **107,70%** do valor inicialmente planejado de **R\$ 6.578.760,66** para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 3.110.780,01	R\$ 32.653.939,43
Proj. complementares	R\$ 0,00	R\$ 6.306.688,13
Manutenção e Atas	R\$ 3.974.375,64	R\$ 21.257.731,15
	R\$ 3.774.387,75	R\$ 60.218.358,71

## 5.1 - EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (mês do Relatório)

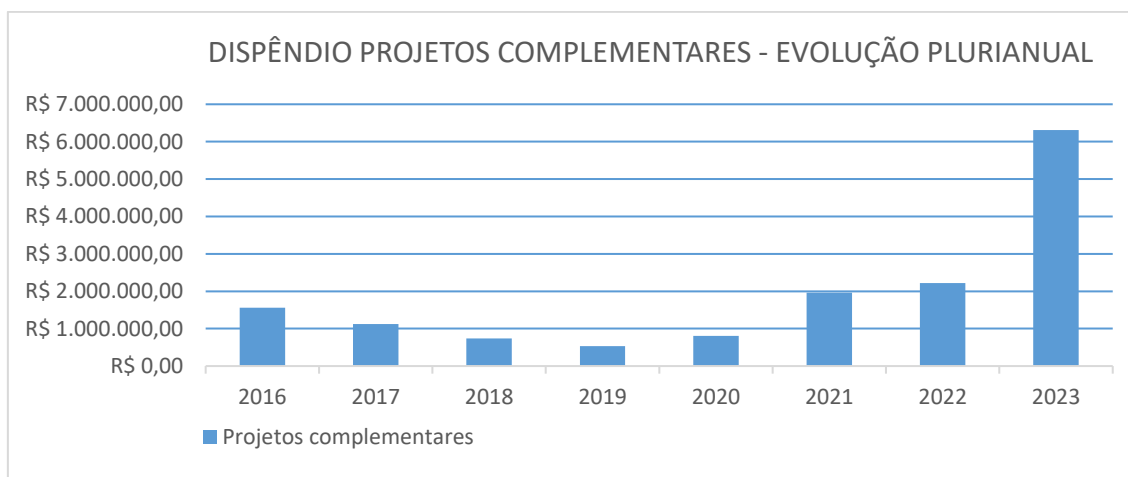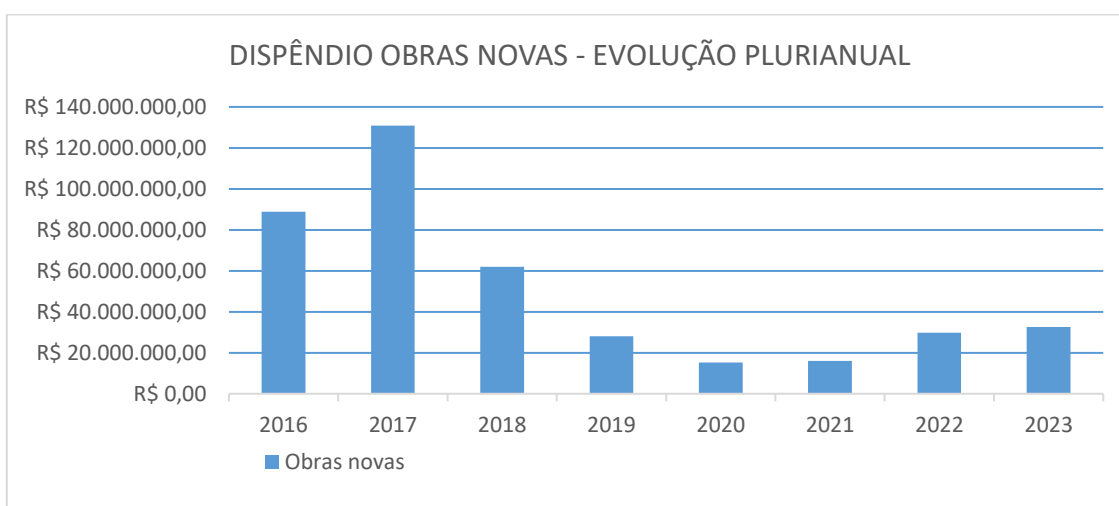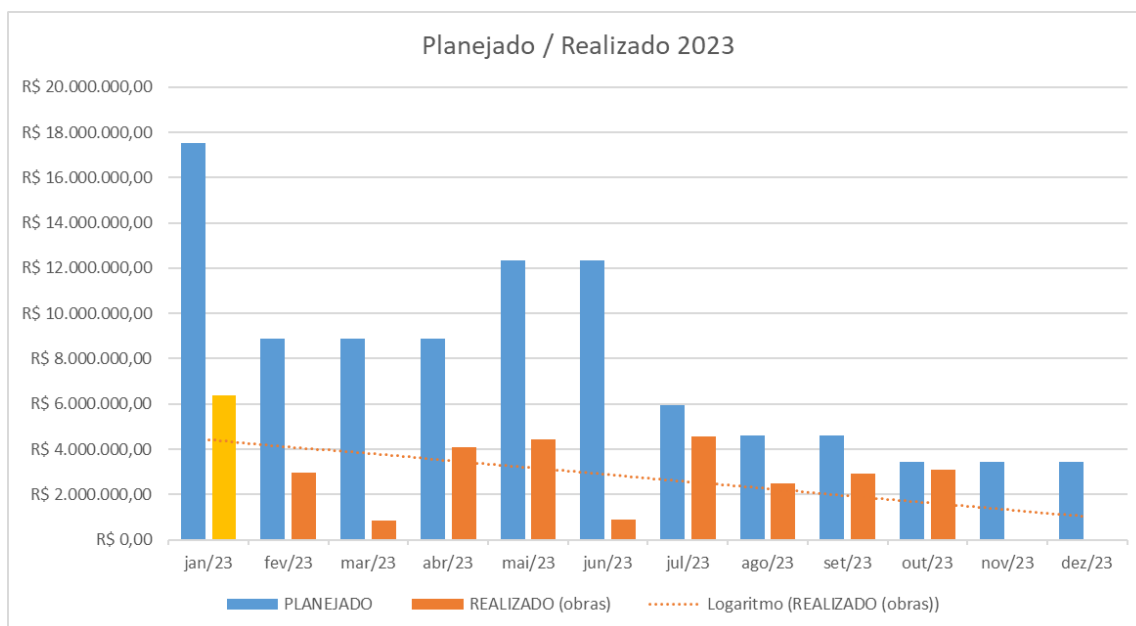

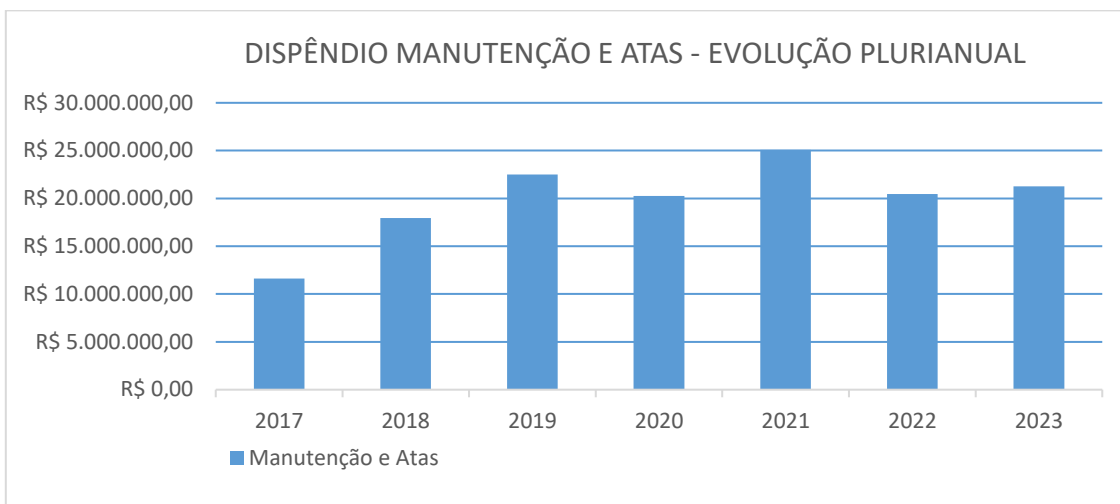


## 6. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

### CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

- a. Manutenção Elevadores
- b. Manutenção Ar condicionado
- c. Manutenção Geradores
- d. Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
- e. Manutenção Sala Segura e Data Center
- f. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
- g. Ata de Instalação de Ar condicionado
- h. Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de **R\$ 3.974.375,64** e acumulado anual de **R\$ 21.257.731,15**, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

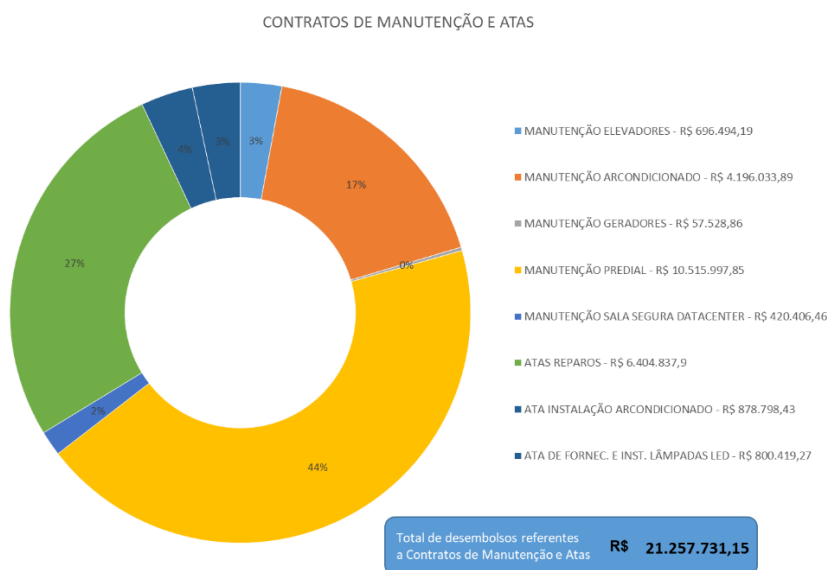



## 7. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS


As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).

### 7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2023	R\$ 510.487,83
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2023	R\$ 144.504,72
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	04/11/2023	R\$ 183.357,72

Desembolso no período do Relatório	R\$ 50.071,24
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 696.494,19

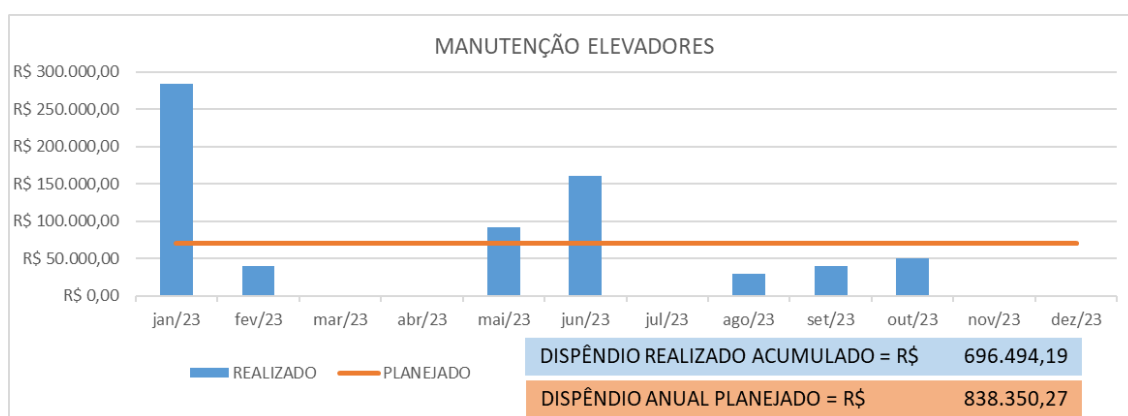


### 7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	01/03/2024	R\$ 6.081.099,96

Desembolso no período do Relatório	R\$ 385.806,90
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 4.196.033,89

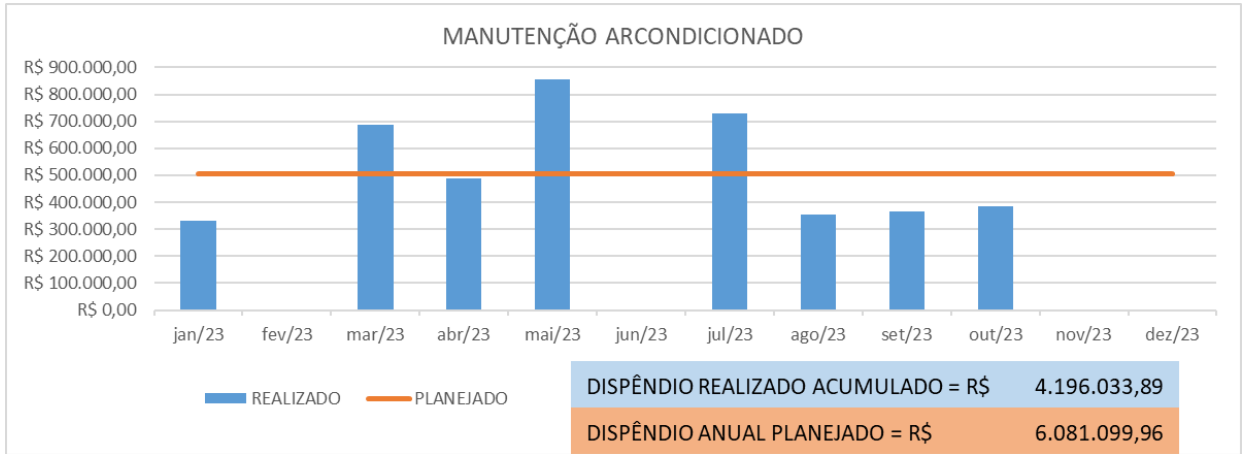


### 7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	18/08/2023	R\$ 81.055,56

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 57.528,86

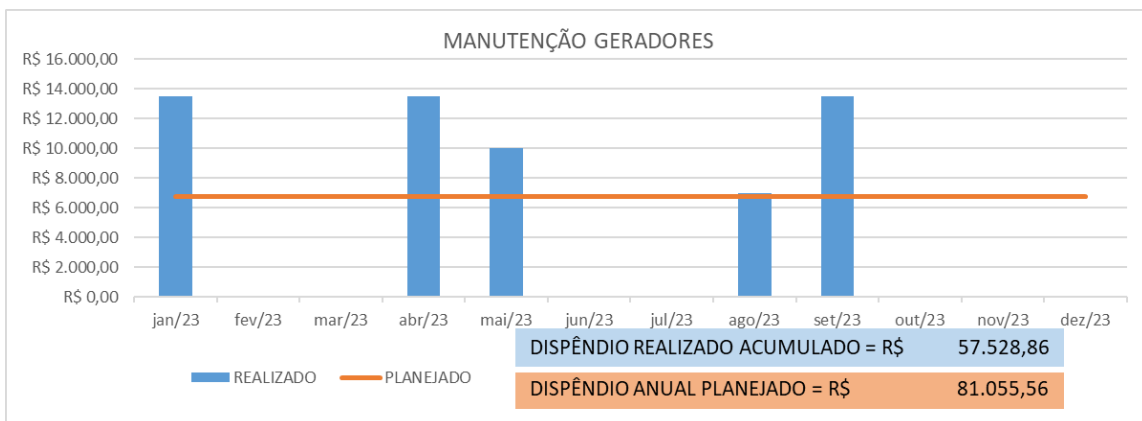


### 7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná,

com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços. Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	05/04/2023	R\$ 13.639.427,57

Desembolso no período do Relatório	R\$ 2.274.667,21
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 10.515.997,85

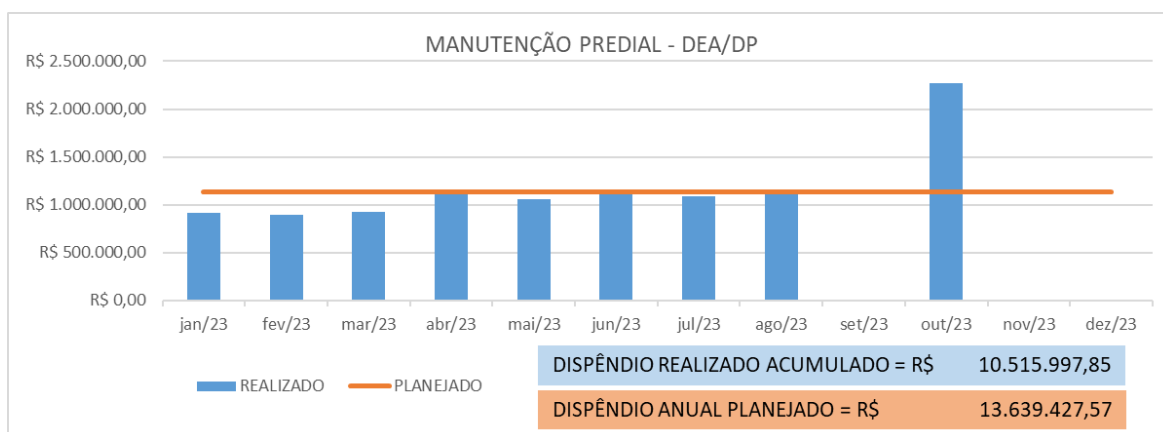

### TOTAL DE SERVIÇOS:

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 19.034,34
CASCADEL	Atestado	R\$ 11.836,77
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 8.094,75
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 14.754,74
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 4.066,73
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 12.814,22
LONDRINA	Atestado	R\$ 19.362,38
MARINGÁ	Atestado	R\$ 10.696,24
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 5.991,91
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 56.344,18
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 12.118,68
TELÊMACO BORBA	Atestado	R\$ 1.833,98
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 3.048,07
<b>13 UNIDADES</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 179.996,97</b>

### RESUMOS DAS CIDADES:

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
ALTO PARANÁ	Atestado	R\$ 232,30
ALTO PIQUIRI	Atestado	R\$ 8,24
ALTÔNIA	Atestado	R\$ 1.689,38
AMPÉRE	Atestado	R\$ 200,71
ANDIRÁ	Atestado	R\$ 935,64
ARAPONGAS	Atestado	R\$ 2.211,43
ARAPOTI	Atestado	R\$ 307,03
ASSAÍ	Atestado	R\$ 1.076,18
ASSIS CHATEAUBRIAND	Atestado	R\$ 741,79
ASTORGA	Atestado	R\$ 475,38
BANDEIRANTES	Atestado	R\$ 763,81
BARBOSA FERRAZ	Atestado	R\$ 641,12
BARRAÇÃO	Atestado	R\$ 92,81
CAMBE	Atestado	R\$ 4.295,39
CAMPO MOURAO	Atestado	R\$ 6.147,12
CÂNDIDO DE ABREU	Atestado	R\$ 24,80
CANTAGALO	Atestado	R\$ 12,72
CAPANEMA	Atestado	R\$ 1.333,06
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Atestado	R\$ 607,00
CARLÓPOLIS	Atestado	R\$ 1.606,13
CASCAVEL	Atestado	R\$ 2.716,92
CASTRO	Atestado	R\$ 728,71
CATANDUVAS	Atestado	R\$ 169,58
CENTENÁRIO DO SUL	Atestado	R\$ 375,62
CHOPINZINHO	Atestado	R\$ 211,25
CLEVELÂNDIA	Atestado	R\$ 14,64
CORBÉLIA	Atestado	R\$ 339,23
CORNELIO PROCOPIO	Atestado	R\$ 62,78
CORONEL VIVIDA	Atestado	R\$ 281,61
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 5.637,17
CURIÚVA	Atestado	R\$ 323,77
ENGENHEIRO BELTRÃO	Atestado	R\$ 1.369,24
FAXINAL	Atestado	R\$ 64,53
FORMOSA DO OESTE	Atestado	R\$ 1.898,61
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 3.656,45
FRANCISCO BELTRAO	Atestado	R\$ 663,11
GRANDES RIOS	Atestado	R\$ 200,67
GUARANIAÇU	Atestado	R\$ 742,55
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 5.761,32
IBAITI	Atestado	R\$ 122,40
IBIPORA	Atestado	R\$ 31,82
ICARAÍMA	Atestado	R\$ 3,95
IMBITUVA	Atestado	R\$ 15,84
IPORÃ	Atestado	R\$ 816,11
IRATI	Atestado	R\$ 1.709,68
IRETAMA	Atestado	R\$ 7.221,98
IVAIPORÃ	Atestado	R\$ 2.233,73
JACAREZINHO	Atestado	R\$ 2.003,75
JAGUAPITA	Atestado	R\$ 1.562,90
JAGUARIAÍVA	Atestado	R\$ 158,88
JOAQUIM TAVORA	Atestado	R\$ 2.194,76
LOANDA	Atestado	R\$ 225,40
LONDRINA	Atestado	R\$ 5.891,28

MALLET	Atestado	R\$ 791,36
MANDAGUAÇU	Atestado	R\$ 214,56
MANDAGUARI	Atestado	R\$ 624,98
MANGUEIRINHA	Atestado	R\$ 597,30
MANOEL RIBAS	Atestado	R\$ 450,34
MARIALVA	Atestado	R\$ 330,19
MARILÂNDIA DO SUL	Atestado	R\$ 325,69
MARINGA	Atestado	R\$ 2.770,79
MARMELEIRO	Atestado	R\$ 430,16
MATELÂNDIA	Atestado	R\$ 332,62
MEDIANEIRA	Atestado	R\$ 170,27
NOVA AURORA	Atestado	R\$ 283,02
NOVA ESPERANÇA	Atestado	R\$ 2.112,97
NOVA FÁTIMA	Atestado	R\$ 4.773,00
ORTIGUEIRA	Atestado	R\$ 139,97
PALMEIRA	Atestado	R\$ 249,67
PALMITAL	Atestado	R\$ 29,24
PARAÍSO DO NORTE	Atestado	R\$ 1.181,88
PARANAVAI	Atestado	R\$ 2.506,31
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 1.199,94
PÉROLA	Atestado	R\$ 234,85
PINHÃO	Atestado	R\$ 1.252,36
PIRAÍ DO SUL	Atestado	R\$ 31,51
PITANGA	Atestado	R\$ 2.788,08
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 53.386,07
PRIMEIRO DE MAIO	Atestado	R\$ 332,78
PRUDENTÓPOLIS	Atestado	R\$ 810,48
QUEDAS DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 3.391,15
REALEZA	Atestado	R\$ 1.073,06
RESERVA	Atestado	R\$ 250,26
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 1.933,00
RIBEIRÃO DO PINHAL	Atestado	R\$ 498,51
ROLÂNDIA	Atestado	R\$ 2.598,79
SALTO DO LONTRA	Atestado	R\$ 1.057,73
SANTA ISABEL DO IVAÍ	Atestado	R\$ 1.114,75
SANTA MARIANA	Atestado	R\$ 1.061,01
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Atestado	R\$ 1.154,89
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	Atestado	R\$ 130,28
SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Atestado	R\$ 96,95
SAO JOAO	Atestado	R\$ 39,31
SÃO JOÃO DO IVAÍ	Atestado	R\$ 115,25
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Atestado	R\$ 62,11
SÃO MATEUS DO SUL	Atestado	R\$ 830,09
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 240,01
SARANDI	Atestado	R\$ 809,50
SENGÉS	Atestado	R\$ 982,14
SERTANÓPOLIS	Atestado	R\$ 180,32
TELEMACO BORBA	Atestado	R\$ 161,25
TERRA BOA	Atestado	R\$ 1.305,90
TERRA RICA	Atestado	R\$ 18,24
TERRA ROXA	Atestado	R\$ 1.383,36
TIBAGI	Atestado	R\$ 407,56
TOLEDO	Atestado	R\$ 1.921,64
TOMAZINA	Atestado	R\$ 2.673,32

UMJARAMA	Atestado	R\$ 44,64
UNIAO DA VITORIA	Atestado	R\$ 2.155,87
URAI	Atestado	R\$ 590,60
WENCESLAU BRAZ	Atestado	R\$ 552,83
<b>111 CIDADES</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 179.996,97</b>

- Foram realizadas 363 intervenções corretivas e 96 preventivas nas comarcas do interior, no período.

- No mês de abril foram substituídas 754 lâmpadas e refletores para o interior.

### Relatório Regional 1

CIDADE	VALOR APROVADO
Almirante Tamandaré	R\$ 5.627,44
Antonina	R\$ 0,00
Araucária	R\$ 6.212,95
Bocaiúva Do Sul	R\$ 0,00
Campina Grande Do Sul	R\$ 6.552,73
Campo Largo	R\$ 0,00
Cerro Azul	R\$ 989,38
Colombo	R\$ 1.393,71
Curitiba	R\$ 87.347,28
Fazenda Rio Grande	R\$ 1.062,64
Guaratuba	R\$ 623,97
Lapa	R\$ 206,54
Matinhos	R\$ 936,54
Morretes	R\$ 4.888,94
Paranaguá	R\$ 1.905,65
Pinhais	R\$ 5.390,82
Piraquara	R\$ 309,01
Pontal Do Paraná	R\$ 443,08
	R\$ 0,00
Rio Branco do Sul	R\$ 1.692,90
Rio Negro	R\$ 589,65
São José dos Pinhais	R\$ 0,00
<b>TOTAL MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 126.173,23</b>
<b>TOTAL ACUMULADO CONTRATO 3 (23-24)</b>	<b>R\$ 701.019,84</b>

**TOTAL ACUMULADO 2023\*****R\$ 1.105.900,73**

\*Total dos pagamentos feitos em 23, inclusive o do consolidado de DEZEMBRO do ano anterior (pago em janeiro)

- Foram abertas 558 Ordens de Serviço do tipo Corretivas no período.
- Foram atendidas 467 Ordens de Serviço do tipo Corretivas no período.
- Foram atendidas 14 Ordens de Serviço do tipo Preventivas no período.


#### 7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	28/07/2024	R\$ 357.538,93

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2024	R\$ 308.123,57
Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)			R\$ 20.657,98
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)			R\$ 420.406,46

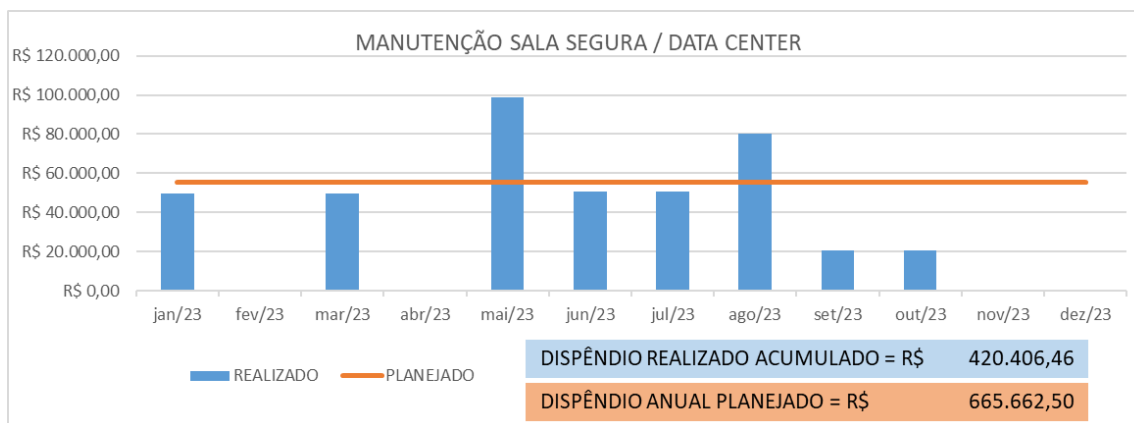


## 7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
REGIONAL 1 - UMUARAMA/MARINGÁ	ABEL SGARIONI ENG E CONST CIVIL LTDA	13/01/2024	R\$ 2.000.000,00
REGIONAL 2 - LONDRINA/JACAREZINHO	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	01/02/2024	R\$ 2.000.000,00
REGIONAL 3 - CASCAVEL/F BELTRÃO	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	07/12/2023	R\$ 1.500.000,00
REGIONAL 4 - GUARAPUAVA/PONTA GROSSA	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	07/06/2024	R\$ 2.000.000,00
REGIONAL 5 - RMC	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	25/01/2024	R\$ 1.000.000,00
REGIONAL 6 - CURITIBA	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	22/05/2024	R\$ 2.500.000,00
REGIONAL MARINGÁ	COVIARTES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/05/2023	R\$ 1.000.000,00
Desembolso no período do Relatório			R\$ 1.243.172,31
Desembolso acumulado no ano do Relatório			R\$ 6.404.837,90




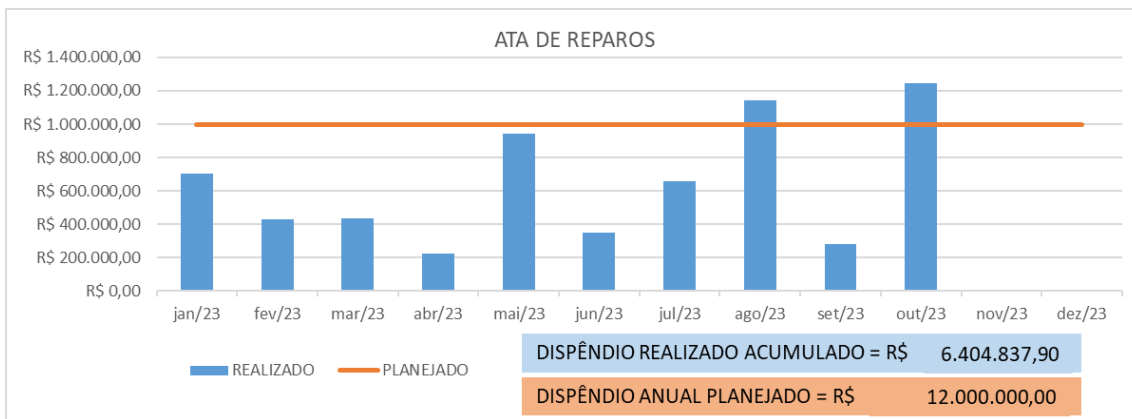

### 7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.


Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23/06/2023	R\$ 1.200.000,00
Desembolso no período do Relatório		R\$ 0,00	
Desembolso acumulado no ano do Relatório		R\$ 878.798,43	

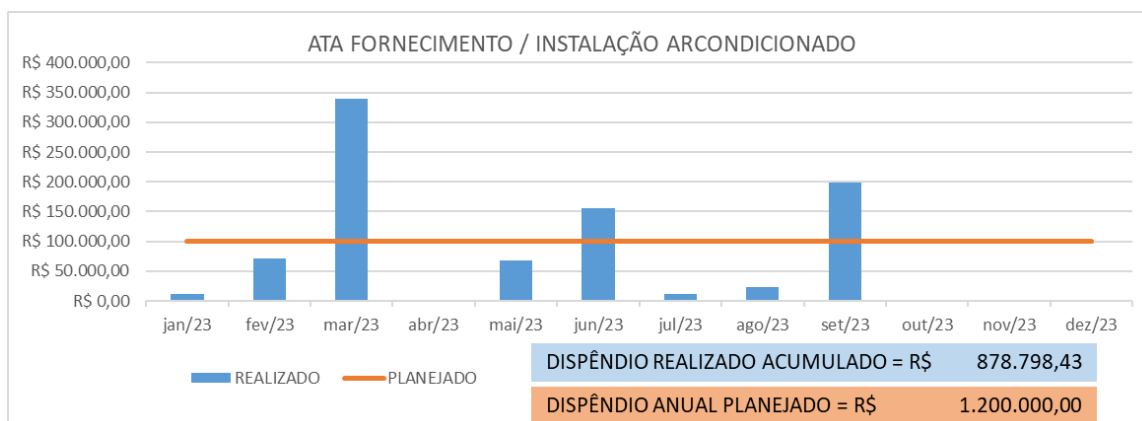

## 7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED

Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	10/01/2023	R\$ 3.400.089,00

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 800.419,27

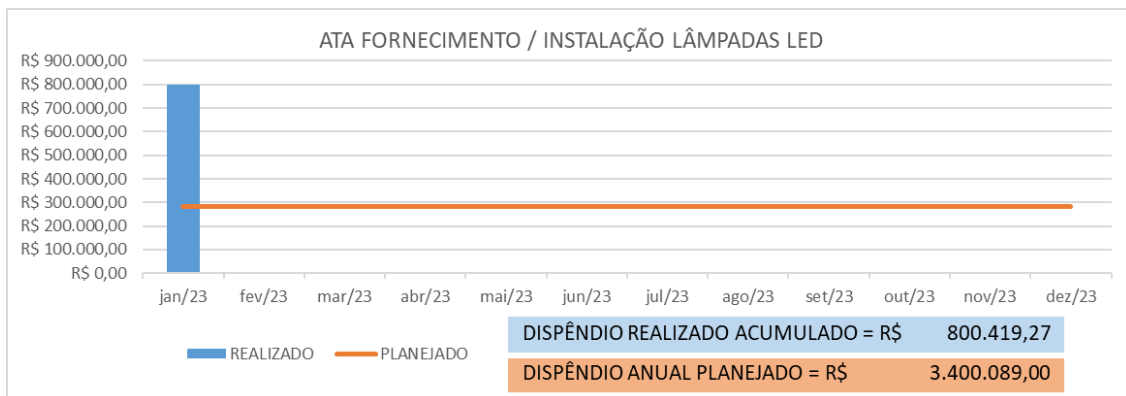

## 7.9 ATIVIDADES RELACIONADAS A ARQUITETURA E DESIGN

ITEM	ATIVIDADE SPA - OUTUBRO	HELENA	GEORGIA	RENATA	GABRIEL	THAÍS
1	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS / EXPEDIENTES	12	104	9	16	
2	ACOMPANHAMENTO / AVALIAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES		24			
3	ADAPTAÇÃO PROJETO PADRÃO - IMPLANTAÇÃO / DETALHES	1	2			
4	ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO					
5	ANÁLISE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM					
6	ANÁLISE DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM					
7	ANÁLISE EDIFÍCIO PARA LOCAÇÃO					
8	ANÁLISE ESPAÇOS / ÁREAS PARA OCUPAÇÃO	3		1	1	
9	APROVAÇÃO DE PROJETOS NA PREFEITURA OU ÓRGÃOS COMPETENTES		2		2	
10	ATUALIZAÇÃO DE PLANTA					
11	CHECKLIST DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO		4			
12	CHEFIA - ASSESSORIA TÉCNICA AOS EXPEDIENTES / ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS / RRT		159			
13	COMUNICAÇÃO EMAILS, TEAMS, WHATSAPP PARA INFORMAÇÃO DE PROJETOS	50	140	31	35	6
14	CONSULTA DE LEGISLAÇÕES/ PREFEITURA PARA AMPLIAÇÃO			3		
15	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO NO SEI	9	5	7	8	
16	ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, SERVIÇOS E PROJETOS		2			
17	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA - EVT					
18	LEVANTAMENTO COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA					
19	LEVANTAMENTO TÉCNICO DO ESPAÇO / LOCAL					
20	LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO			1		
21	PREENCHIMENTO DE CHECKLIST PARA ANÁLISE/ AVALIAÇÃO TÉCNICA			3	4	
22	PRODUÇÃO DE IMAGENS, TEXTURAS (RENDER), PERSPECTIVAS			1	7	
23	PROJETO ARQUITETÔNICO - AMPLIAÇÃO E REFORMA				4	
24	PROJETO ARQUITETÔNICO - FÓRUM NOVO	3		14	19	22
25	PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA E READEQUAÇÕES	7		4	2	
26	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	2				
27	PROJETO DE INTERIORES					
28	PROJETO DE LAYOUT (DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO)					
29	PROJETO DE PAISAGISMO					
30	PROJETO DE PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO					
31	PROJETO DE REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO					
32	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO					
33	PROJETO EXECUTIVO DE MOBILIÁRIO					
34	REUNIÃO	8	51	20	14	17
35	VISITA TÉCNICA DE SERVIÇOS/ OBRAS, ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO / VISTORIA	1		5		
36	COMISSÃO ACESSIBILIDADE - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS	12				
37	COMISSÃO ACESSIBILIDADE - COMUNICAÇÃO EMAIL/TEAMS/WHATSAPP/TELEFONE	22				
38	COMISSÃO ACESSIBILIDADE - ELABORAÇÃO DOCUMENTOS SEI	2				
<b>TOTAL ATIVIDADES</b>		132	493	99	112	45
<b>TOTAL FINAL</b>		<b>881</b>				

ATIVIDADES DE OUTUBRO/2023 - SEÇÃO DE DESIGN	QUANTIDADE
<b>PROJETOS</b>	
Projetos de Comunicação Visual	9
Informações Comunicação Visual e Prorrogação de Prazos	19
Projetos/Layout de Mobiliário	3
Informações Mobiliário	5
Projetos enviado para empresa de Mobiliário	9
Visitas Técnicas	8
<b>ANÁLISE TÉCNICA</b>	
Apreciação / Aprovação de Termo de Referência novas/recorrentes	3
Análise / Aprovação de Protótipos ou Amostras - Divisão de Controle Patrimonial - DP	2
Informações / Pareceres Licitação	4
Visitas Técnica	2
<b>GESTÃO DE ATA DE COMUNICAÇÃO VISUAL</b>	
Projetos enviados para empresa CV	9
Coordenação da logística de agendamento para instalação de CV	4
Acompanhamento de instalação de CV in loco	3
<b>REUNIÕES</b>	
Reuniões semanais	3
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

